COLLEGE LUCIE AUBRAC ARLEQUIN

isère
LE DÉPARTEMENT
www.isere.fr

Réunion du 24 août 2017

Travaux d’expertise et de déménagement

- Expertises de la structure (en cours)
- Nettoyage et évacuation du matériel et du mobilier à récupérer (en cours)

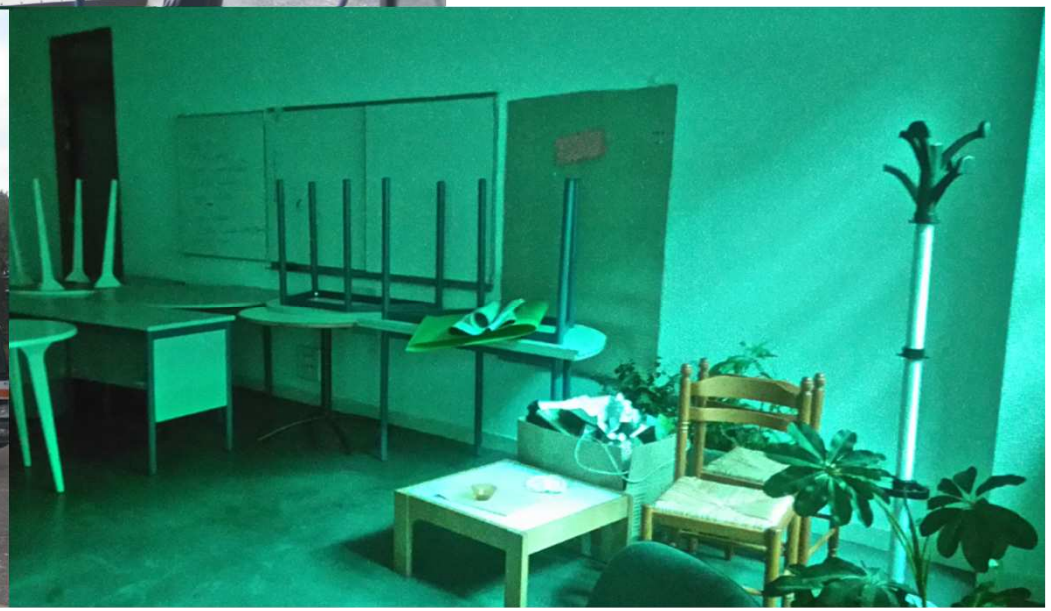

COLLEGE LUCIE AUBRAC GÉANTS
(RÉNOVATION ANCIEN COLLÈGE DES SAULES)

isère
LE DÉPARTEMENT
www.isere.fr

Réunion du 24 août 2017

Avancement des travaux

Avis favorable des commissions de sécurité et d'accessibilité

Travaux réalisés:

- Plafonds (100 %)
- Peinture (100 %)
- Sols (90 %)
- Plomberie (90 %)
- Travaux d'électricité et de sécurisation (80%):
  - Câblage (fait)
  - Pose des luminaires (fait)
  - Éclairage extérieur (fait)
- Pose vidéoprojecteurs (en cours)
- Mobilier de l'administration (fait) arrivée du personnel le 28/08

Avancement des travaux

Travaux restant à réaliser:

- Sécurisation incendie (mise en service le 28/08)
- Téléphonie et liaison internet (en cours)
- Pose vidéoprojecteurs (en cours)
- Installation du mobilier des salles d'enseignement (en cours)
- Pose des tableaux (à partir du 28/08)
- Livraison et pose de la signalétique (28 et 29/08)
- Pose des sanitaires extérieurs et des préaux (à partir du 28/08)
- Nettoyage/élagage: espaces verts, patio, terrasses(à partir du 28/08)
- Nettoyage fin de toutes les pièces (à partir du 28/08)
- Volets métalliques sur accès accueil et élèves (à partir du 28/08)

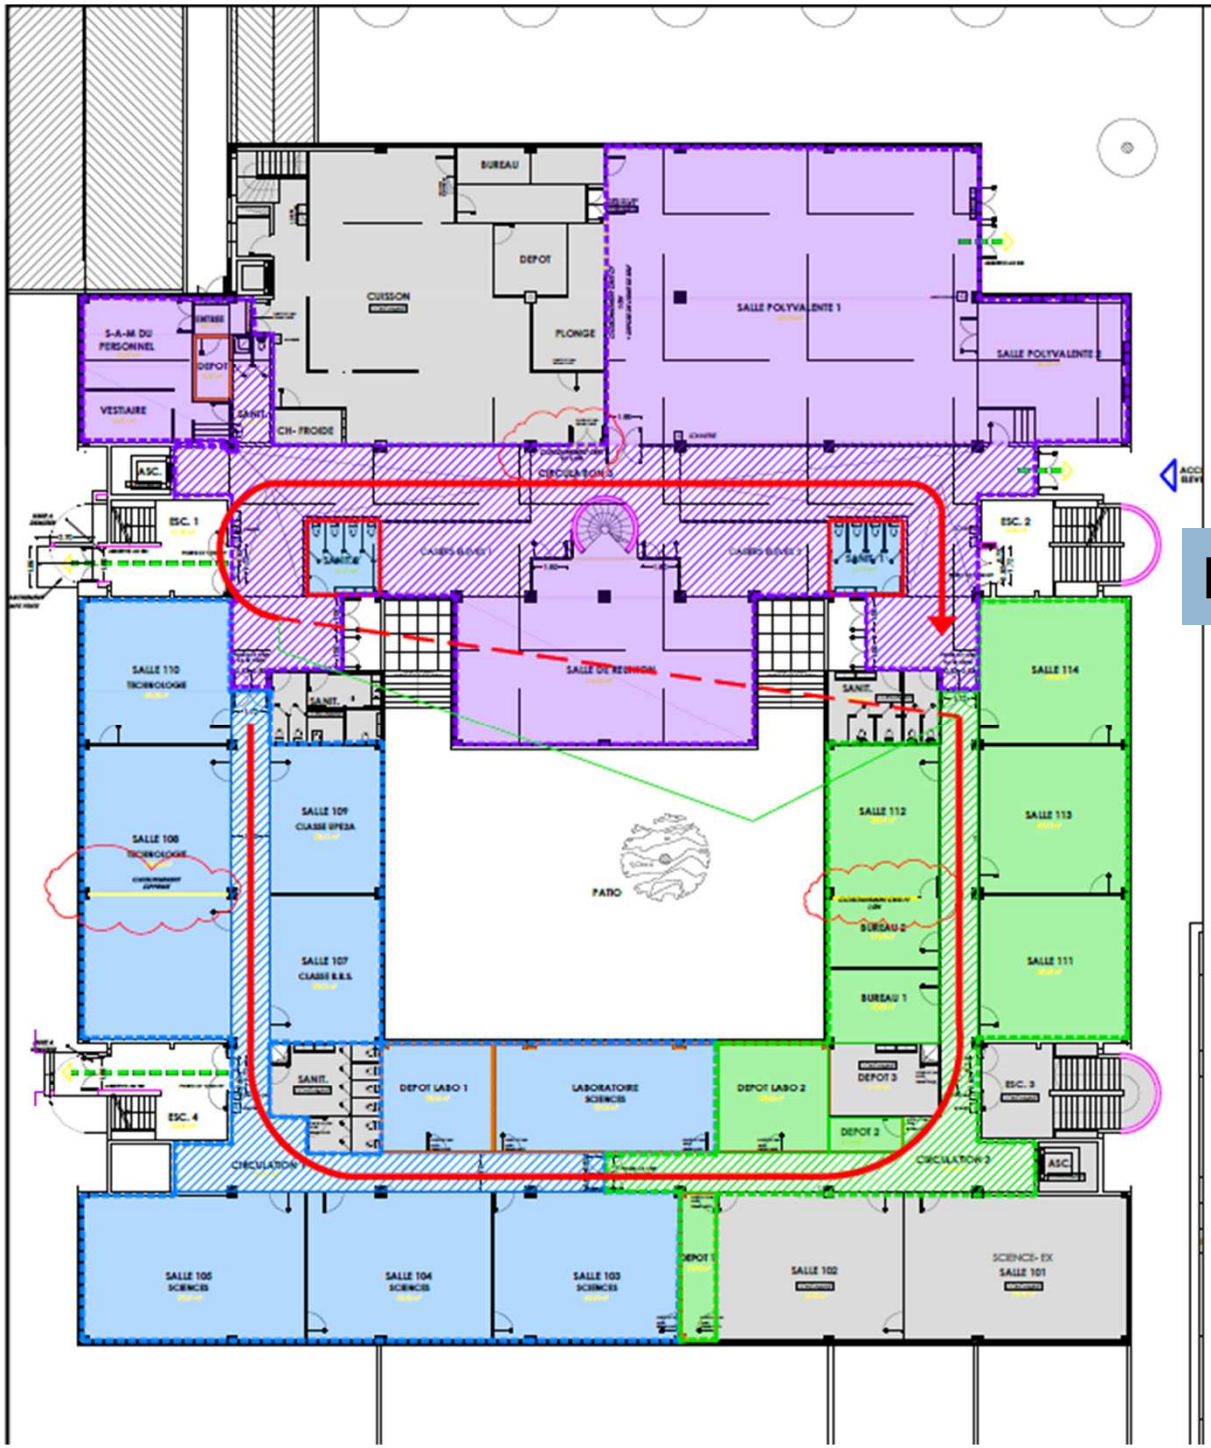

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

AVANCEMENT NIVEAU 1

Phases 1 et 2 terminées

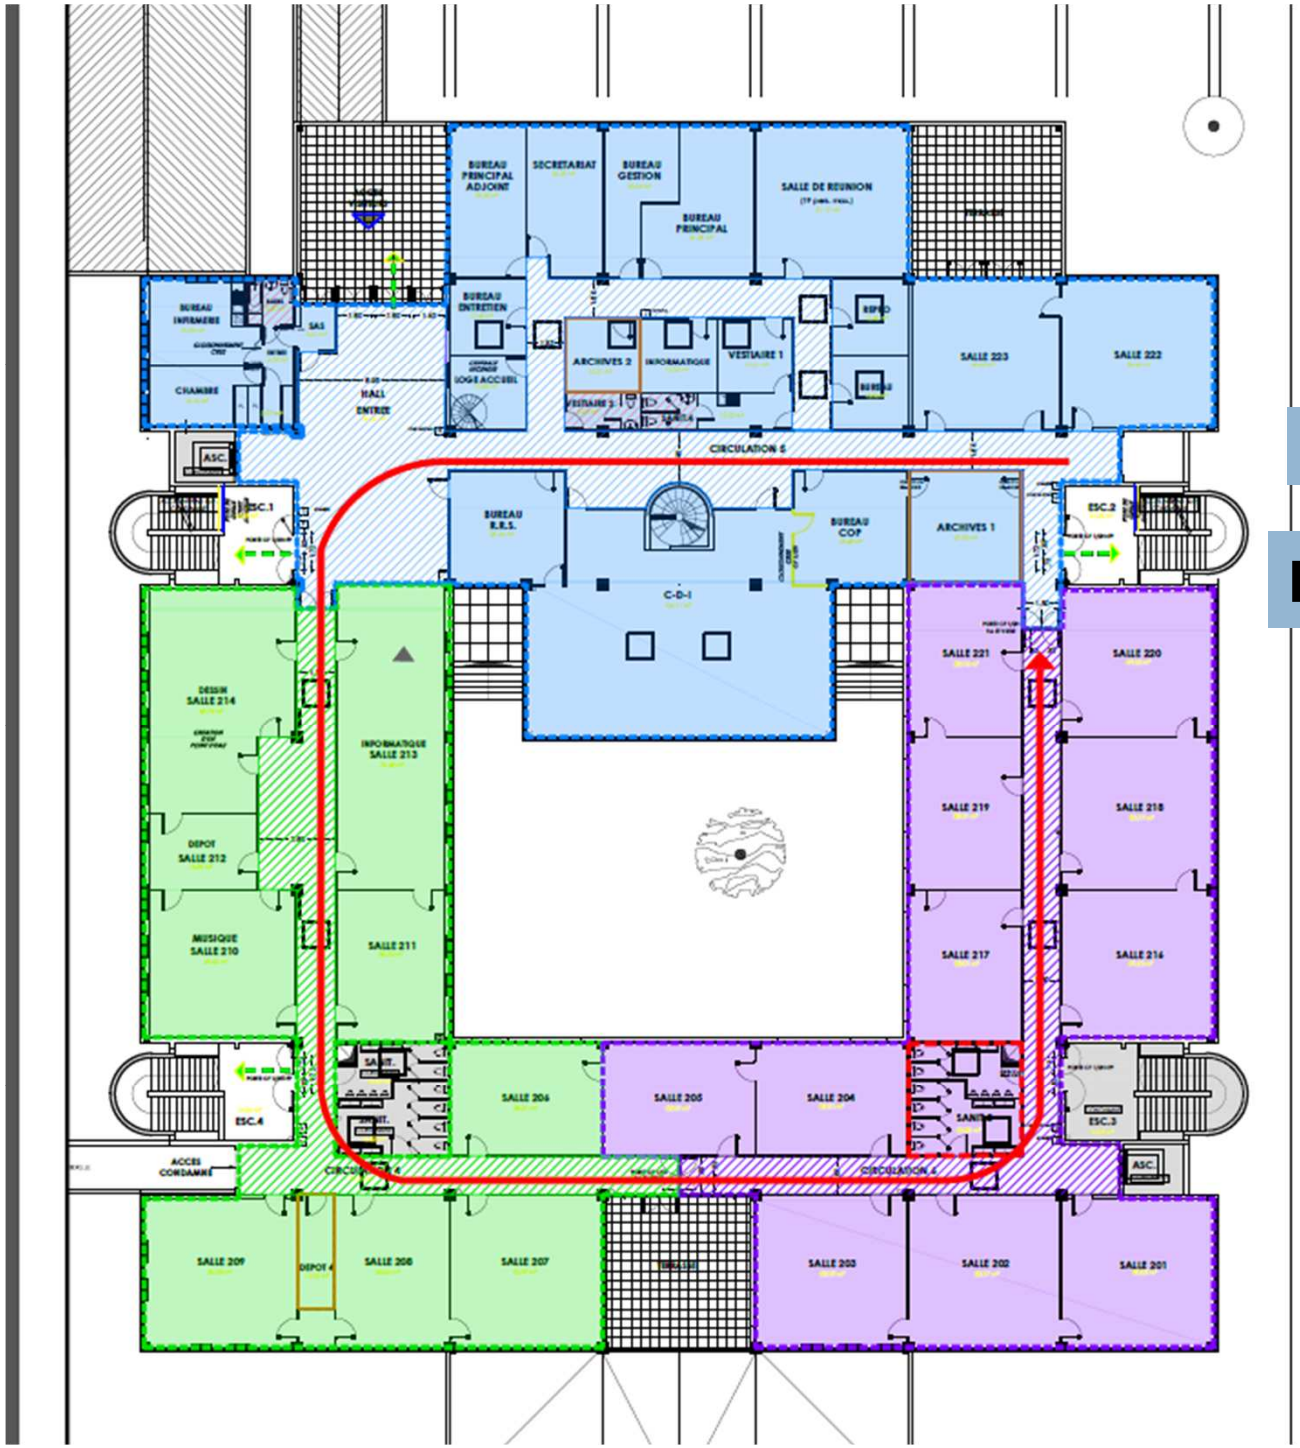

PHASE 1 (environ 25 pièces)

PHASE 2 (environ 10 pièces)

PHASE 3 (environ 11 pièces)

AVANCEMENT NIVEAU 2

Phases 1 et 2 terminées

RESTE A REALISER
Parties extérieures

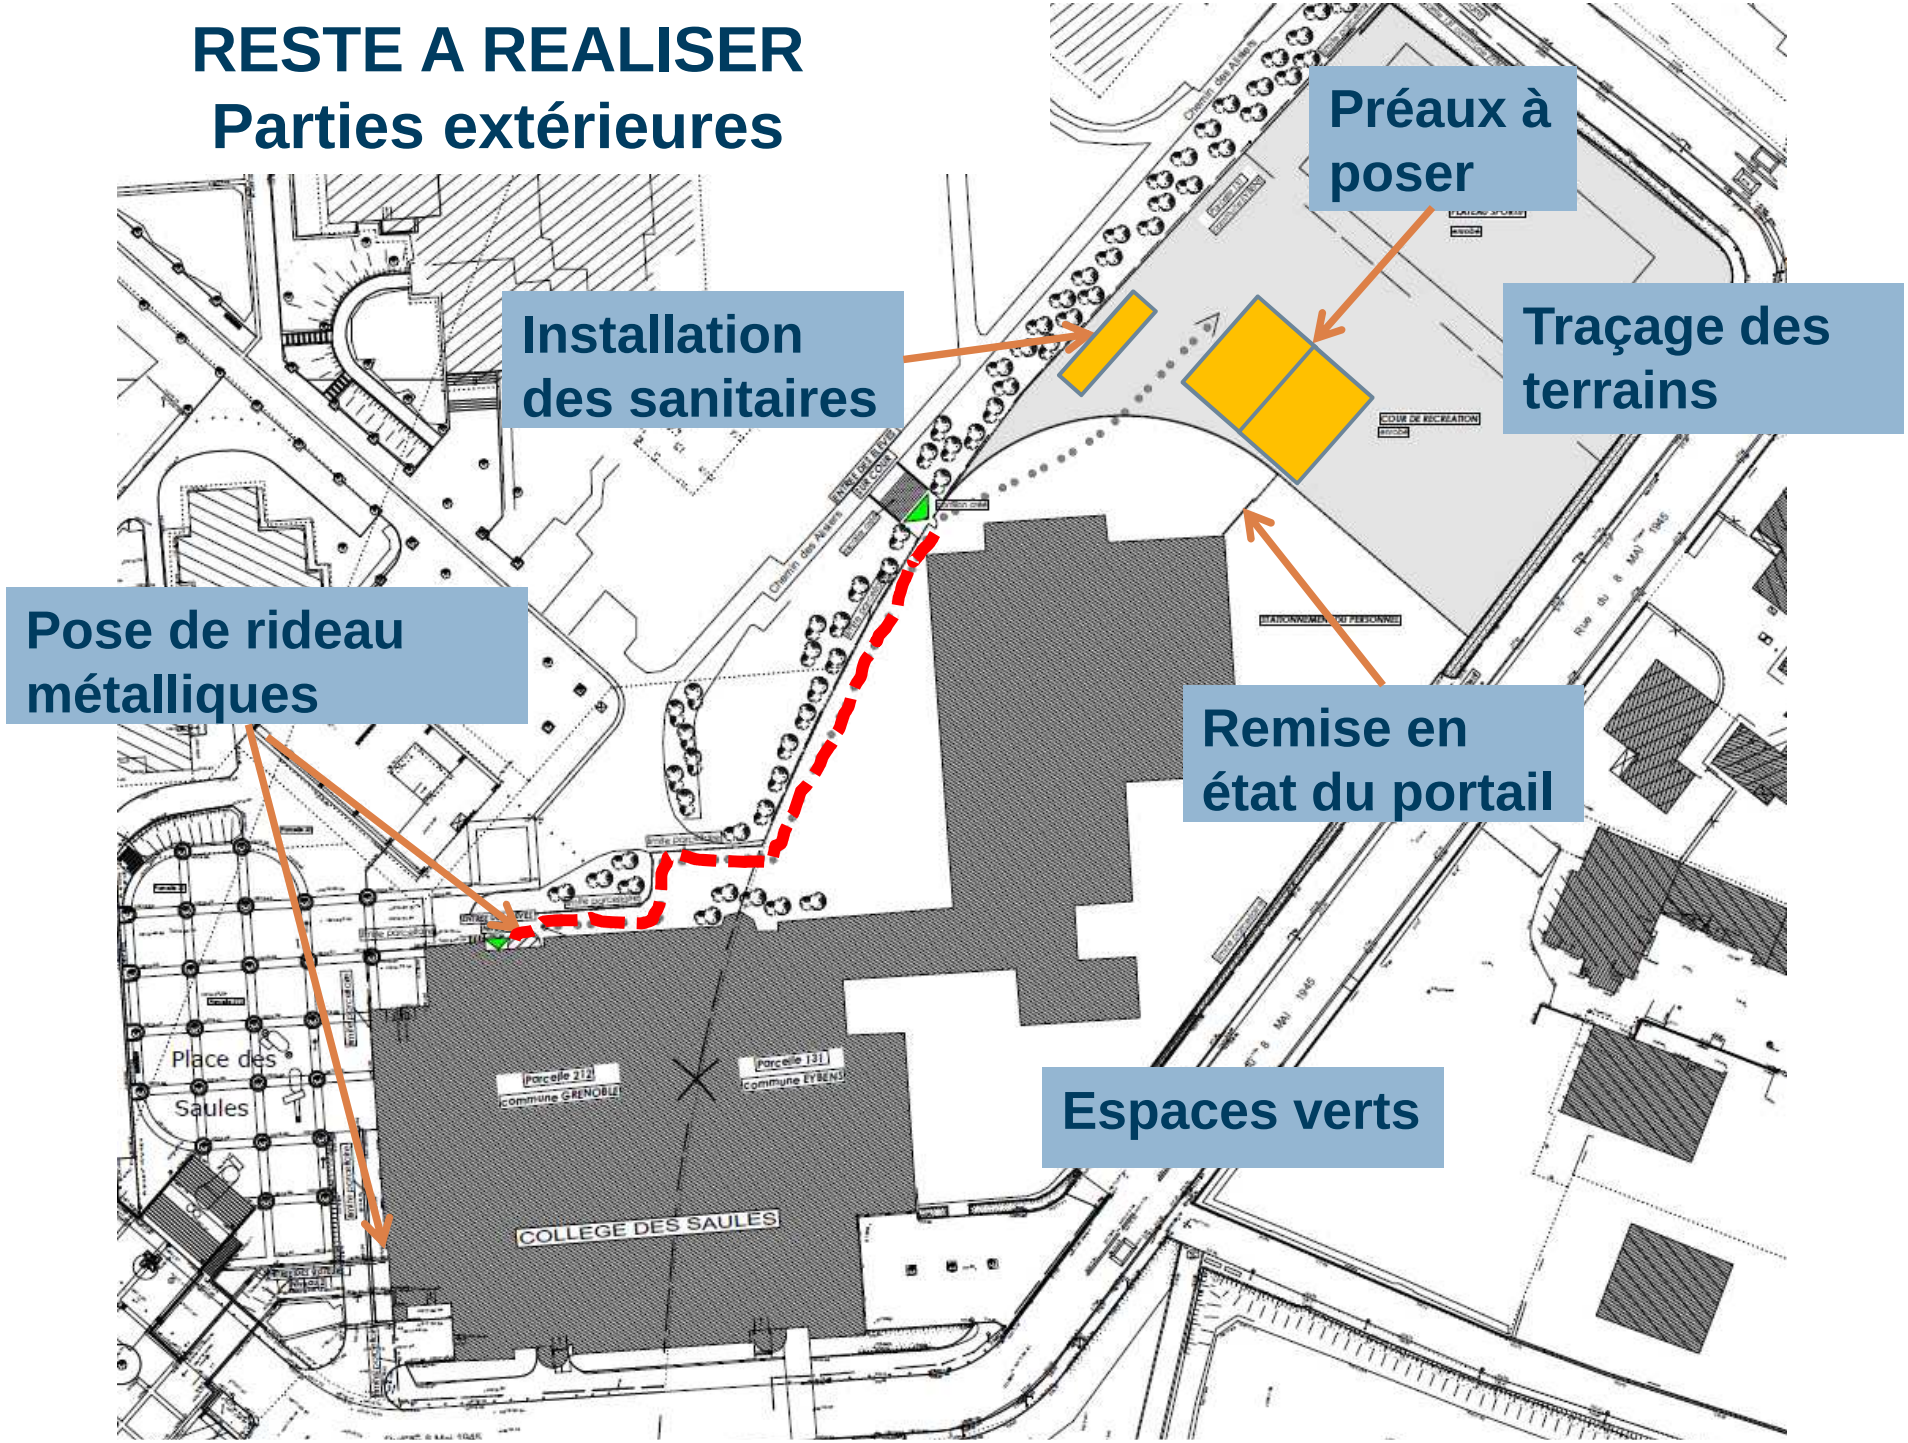

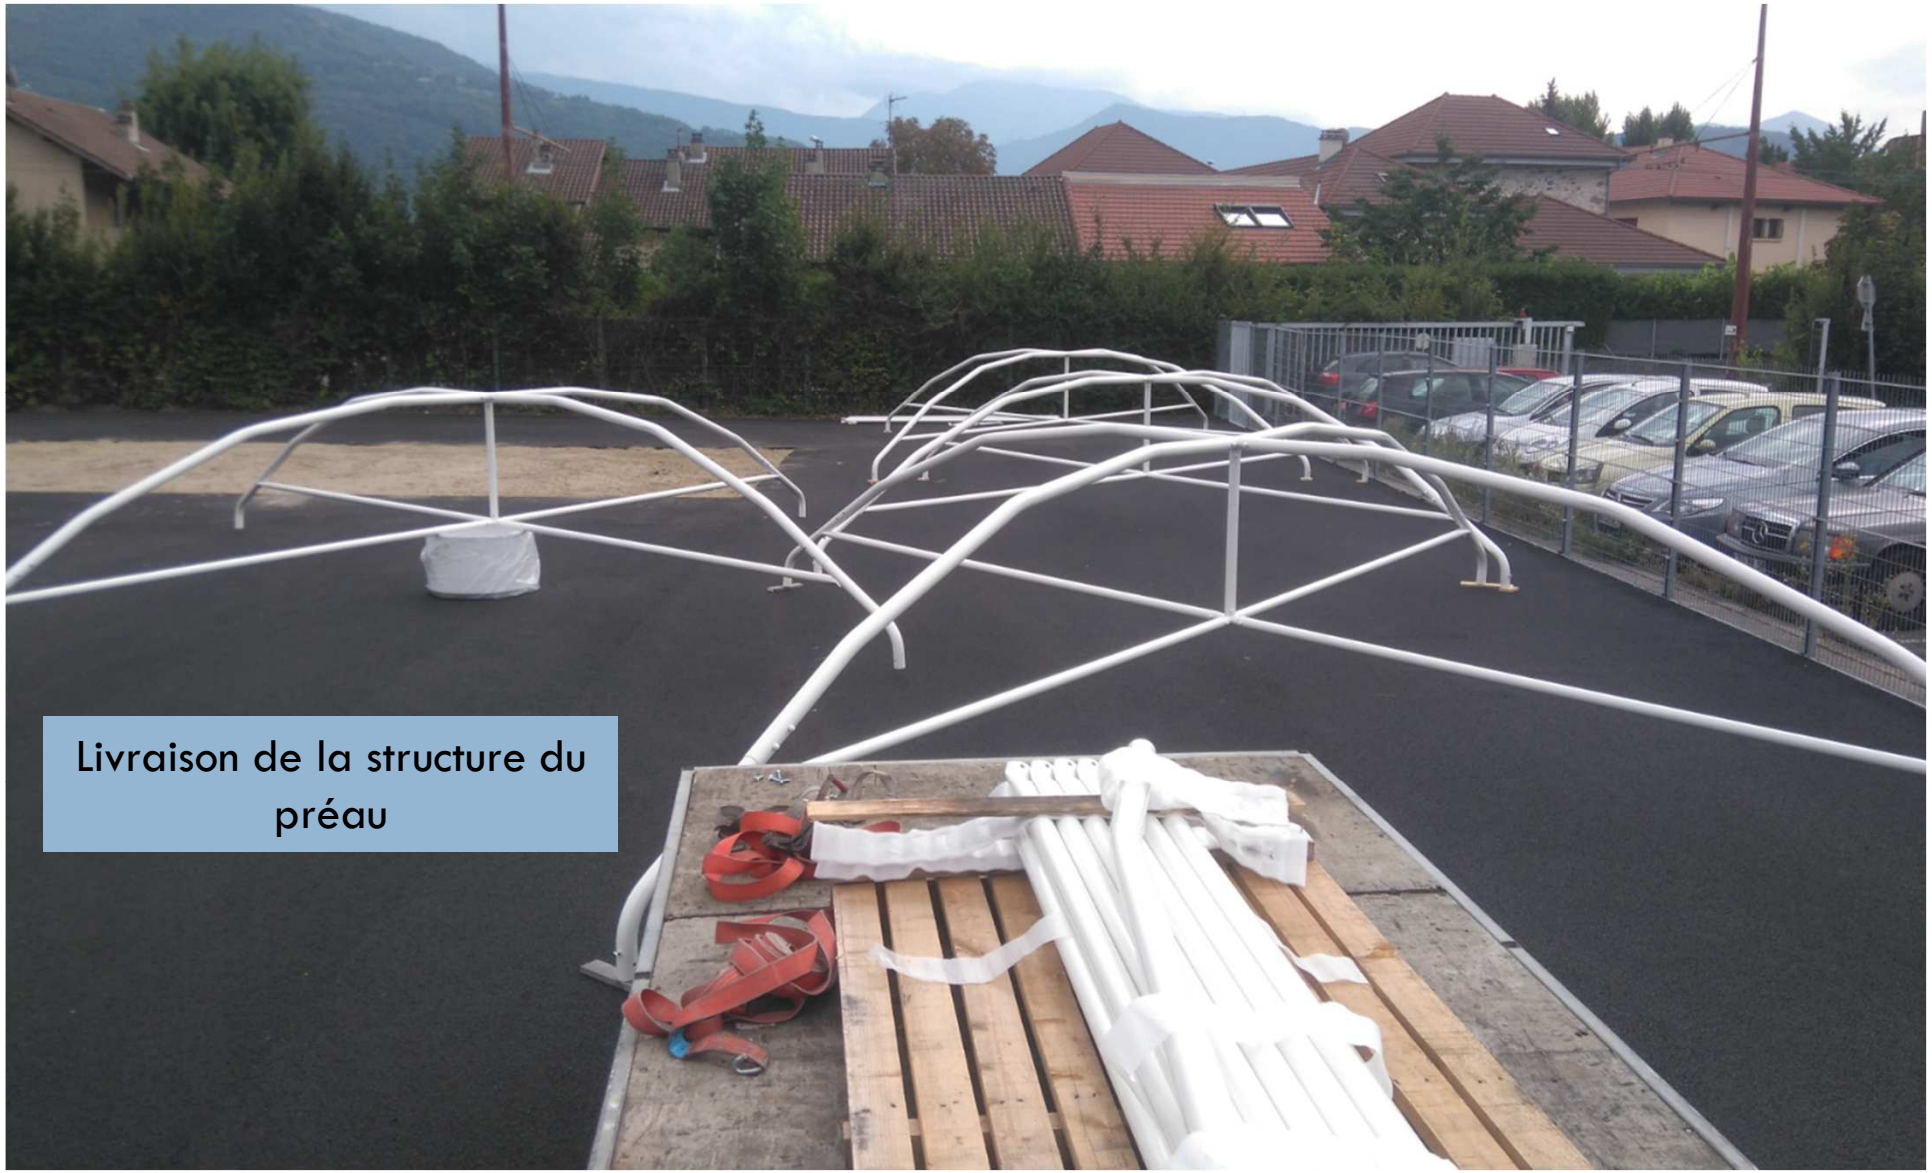
Livraison de la structure du préau

Merci de
mettre vos chaises
sur les tables à midi
et à la fin des cours.

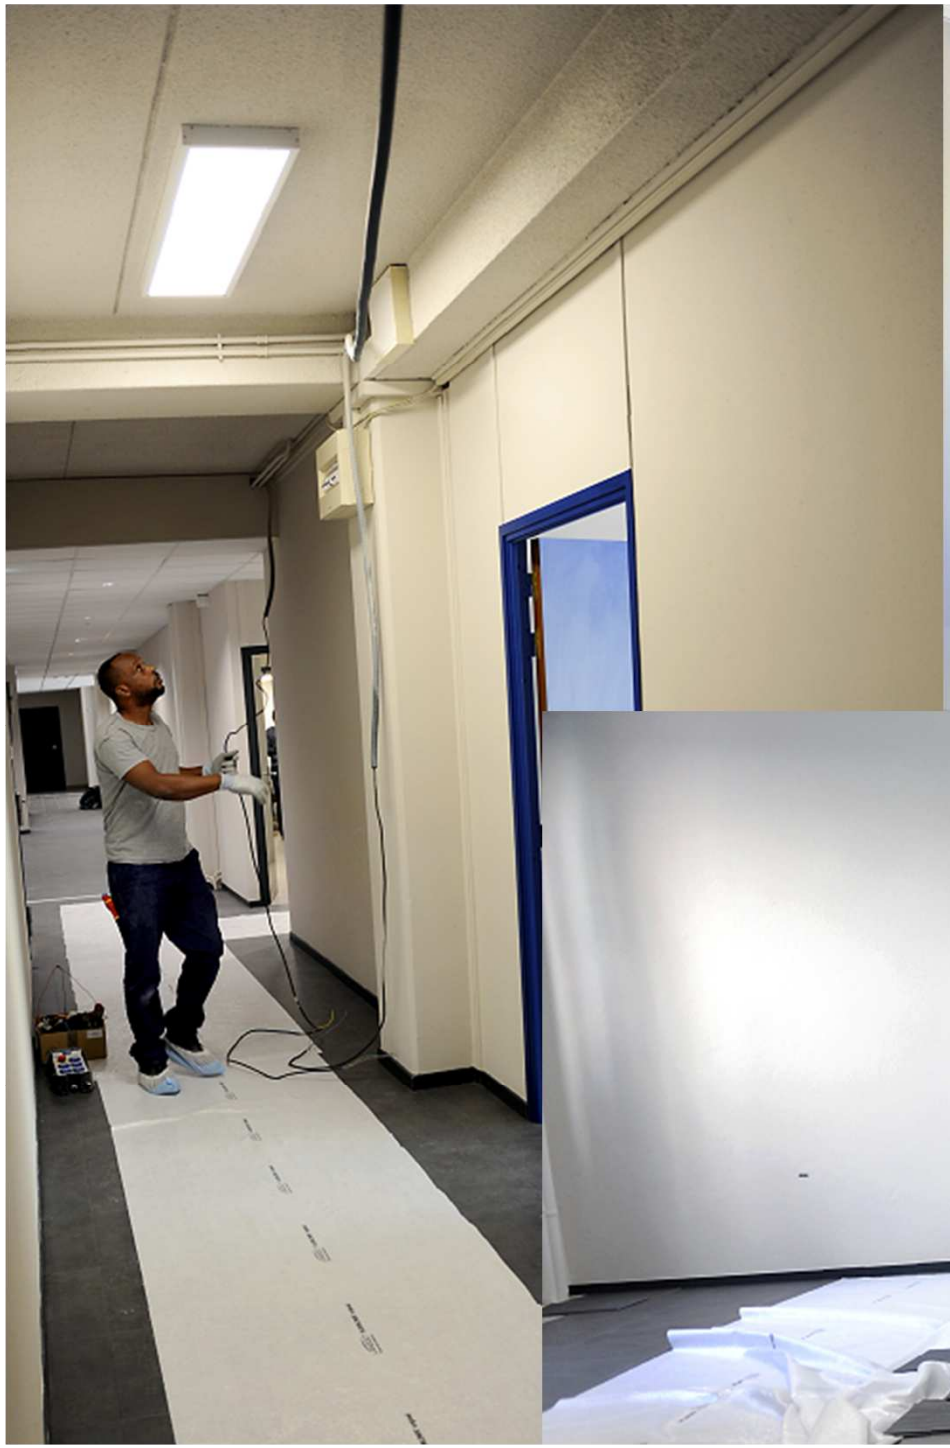

VINAY

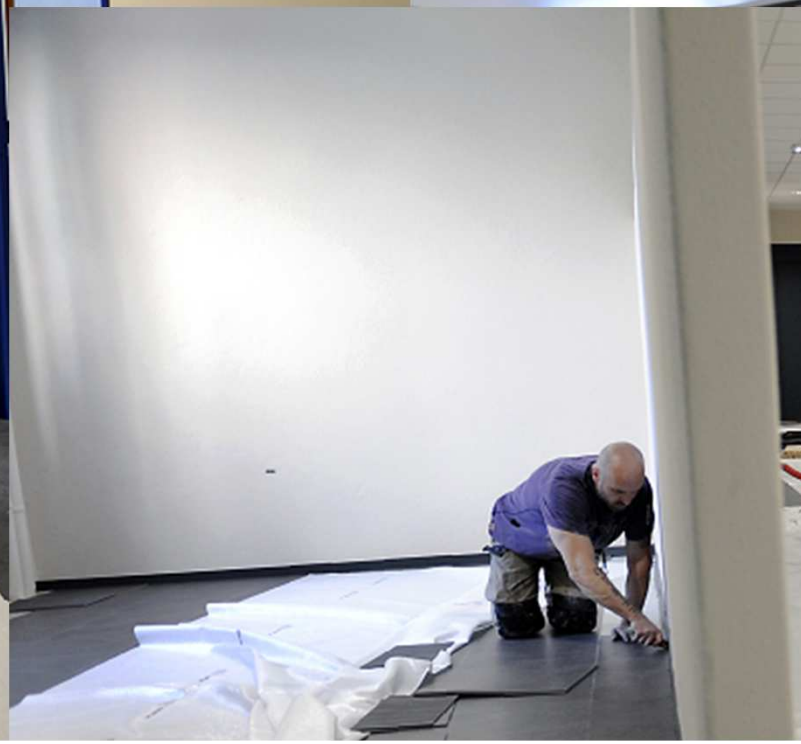

TOUTES INFORMATIONS DISPONIBLES SUR www.isere.fr/projets-college/college-lucie-aubrac

isère
LE DÉPARTEMENT
www.isere.fr

Réunion du 24 août 2017
